Library Search Module

12 лист. 2026 р.

Керівник проекту	
Терміни проекту	16 лист. 2026 р. - 17 груд. 2026 р.
Виконано	0%
Завдання	30
Виконавці	6

ПР-54. Модуль пошуку книжок. План: 16.11.2026–16.12.2026, фінальна контрольна точка 17.12.2026. Пн–Пт, 8 год/день. Завдання 7.3: оцінка 0,5 дня; у GanttProject вікно 1 день і навантаження 50%. Усі залежності FS без затримки.


Завдання

Назва	Дата початку	Дата завершення	Тривалість	Оцінка, дні
1. Формування вимог	16.11.26	18.11.26	3	0
1.1 Визначення функціональних вимог	16.11.26	17.11.26	2	2
1.2 Узгодження нефункціональних вимог	18.11.26	18.11.26	1	1
M1. Завершено формування вимог	19.11.26	19.11.26	0	0
2. Проєктування	18.11.26	20.11.26	3	0
2.1 Створення прототипу інтерфейсу	18.11.26	19.11.26	2	2
2.2 Структура даних і data contract	19.11.26	20.11.26	2	2
M2. Затверджено дизайн інтерфейсу	20.11.26	20.11.26	0	0
3. Розробка фронтенду	23.11.26	02.12.26	8	0
3.1 Головний екран пошуку книжок	23.11.26	25.11.26	3	3
3.2 Сторінка детального перегляду книжки	26.11.26	27.11.26	2	2
3.3 Інтеграція через REST API	01.12.26	02.12.26	2	2
4. Розробка бекенду	23.11.26	30.11.26	6	0
4.1 API для пошуку книжок	24.11.26	26.11.26	3	3
4.2 Ендпойнт детальної інформації	27.11.26	30.11.26	2	2
4.3 Підключення БД і логіка запитів	23.11.26	23.11.26	1	1
M3. Завершено розробку бекенду та фронтенду	03.12.26	03.12.26	0	0
5. Тестування	03.12.26	08.12.26	4	0
5.1 Перевірка функціональності пошуку	03.12.26	04.12.26	2	2
5.2 Тестування продуктивності	07.12.26	07.12.26	1	1
5.3 Перевірка взаємодії клієнта і сервера	08.12.26	08.12.26	1	1
M4. Успішно пройдено тестування	09.12.26	09.12.26	0	0
6. Виправлення помилок	09.12.26	11.12.26	3	0
6.1 Усунення знайдених дефектів	09.12.26	10.12.26	2	2
6.2 Повторне тестування виправлень	11.12.26	11.12.26	1	1
7. Поставка продукту	14.12.26	16.12.26	3	0
7.1 Деплой на сервер бібліотеки	14.12.26	14.12.26	1	1
7.2 Перевірка в реальному середовищі	15.12.26	15.12.26	1	1
7.3 Передача рішення клієнту (0,5 дня)	16.12.26	16.12.26	1	0,5
M5. Поставка продукту клієнту	17.12.26	17.12.26	0	0

Виконавці

Ім'я	Типова роль
Аналітик	Аналітик
Дизайнер	Дизайнер
Фронтенд-розробник	Фронтенд-розробник
Бекенд-розробник	Бекенд-розробник
Тестувальник	Тестувальник
Менеджер проєкту	Менеджер проєкту

GanttChart

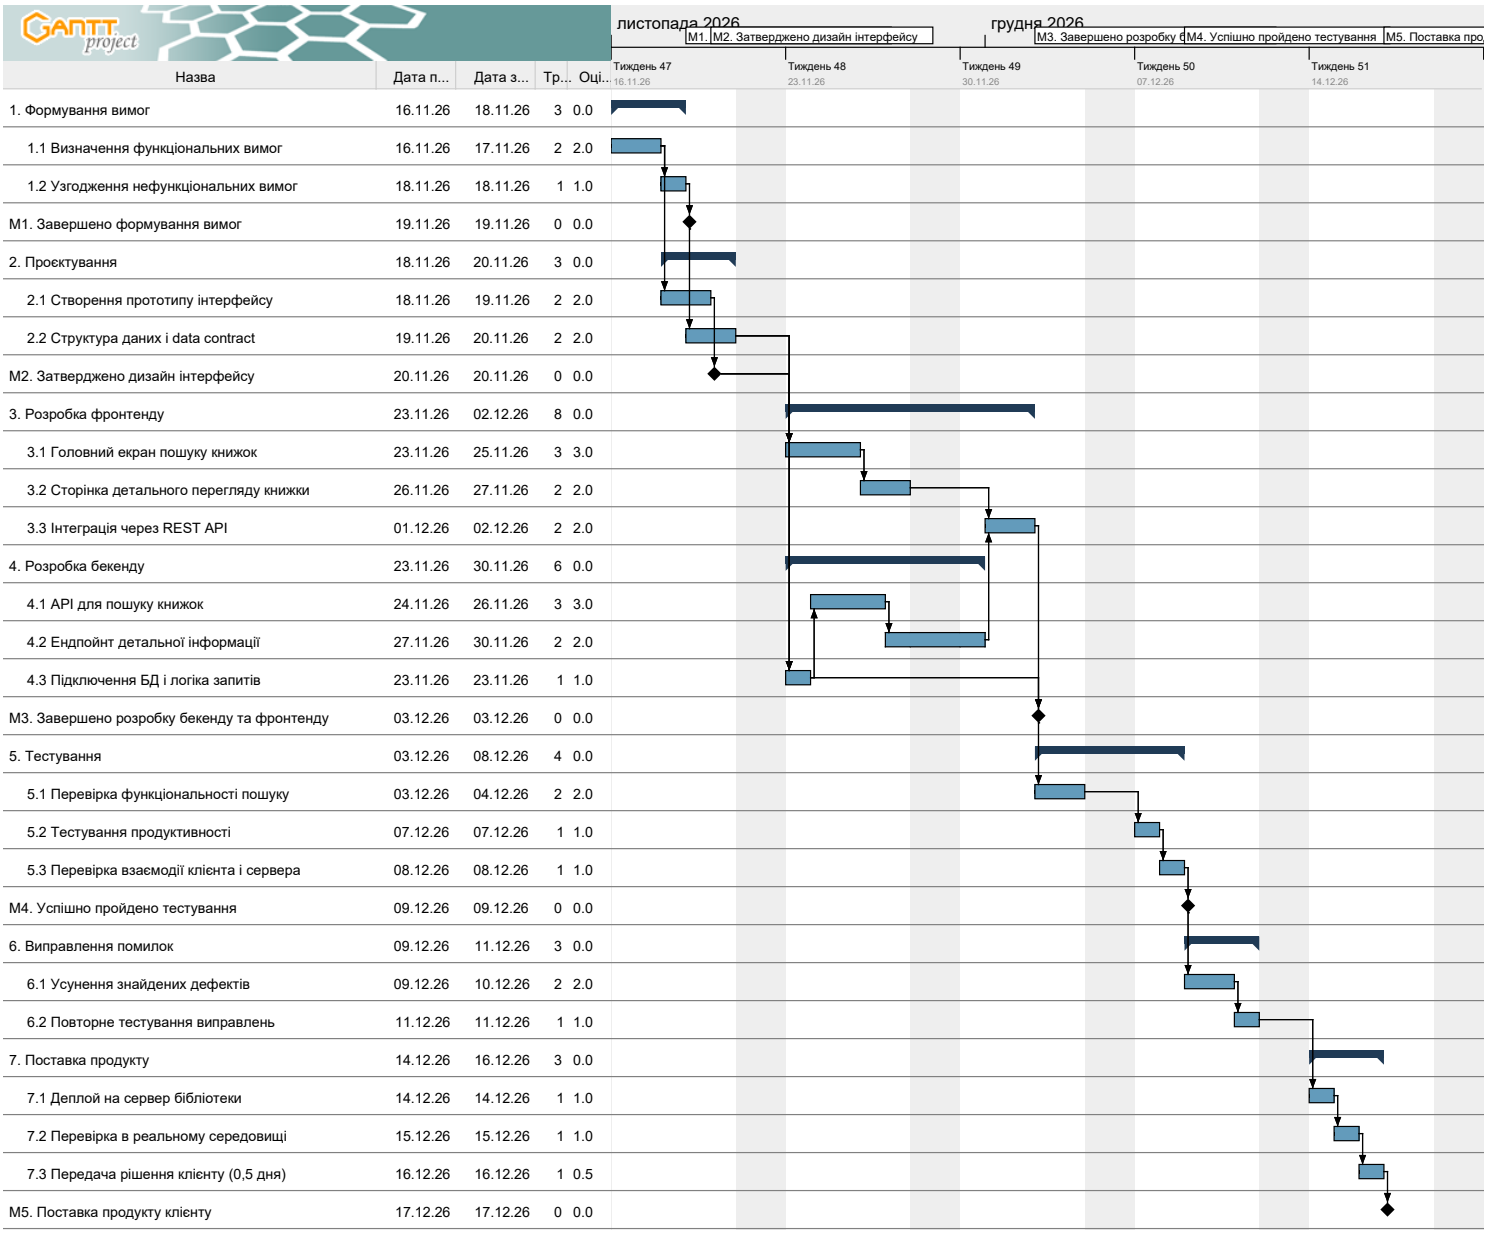

Назва	Дата п...	Дата з...	Тр...	Оці...
1. Формування вимог	16.11.26	18.11.26	3	0.0
1.1 Визначення функціональних вимог	16.11.26	17.11.26	2	2.0
1.2 Узгодження нефункціональних вимог	18.11.26	18.11.26	1	1.0
M1. Завершено формування вимог	19.11.26	19.11.26	0	0.0
2. Проєктування	18.11.26	20.11.26	3	0.0
2.1 Створення прототипу інтерфейсу	18.11.26	19.11.26	2	2.0
2.2 Структура даних і data contract	19.11.26	20.11.26	2	2.0
M2. Затверджено дизайн інтерфейсу	20.11.26	20.11.26	0	0.0
3. Розробка фронтенду	23.11.26	02.12.26	8	0.0
3.1 Головний екран пошуку книжок	23.11.26	25.11.26	3	3.0
3.2 Сторінка детального перегляду книжки	26.11.26	27.11.26	2	2.0
3.3 Інтеграція через REST API	01.12.26	02.12.26	2	2.0
4. Розробка бекенду	23.11.26	30.11.26	6	0.0
4.1 API для пошуку книжок	24.11.26	26.11.26	3	3.0
4.2 Ендпойнт детальної інформації	27.11.26	30.11.26	2	2.0
4.3 Підключення БД і логіка запитів	23.11.26	23.11.26	1	1.0
M3. Завершено розробку бекенду та фронтенду	03.12.26	03.12.26	0	0.0
5. Тестування	03.12.26	08.12.26	4	0.0
5.1 Перевірка функціональності пошуку	03.12.26	04.12.26	2	2.0
5.2 Тестування продуктивності	07.12.26	07.12.26	1	1.0
5.3 Перевірка взаємодії клієнта і сервера	08.12.26	08.12.26	1	1.0
M4. Успішно пройдено тестування	09.12.26	09.12.26	0	0.0
6. Виправлення помилок	09.12.26	11.12.26	3	0.0
6.1 Усунення знайдених дефектів	09.12.26	10.12.26	2	2.0
6.2 Повторне тестування виправлень	11.12.26	11.12.26	1	1.0
7. Поставка продукту	14.12.26	16.12.26	3	0.0
7.1 Деплой на сервер бібліотеки	14.12.26	14.12.26	1	1.0
7.2 Перевірка в реальному середовищі	15.12.26	15.12.26	1	1.0
7.3 Передача рішення клієнту (0,5 дня)	16.12.26	16.12.26	1	0.5
M5. Поставка продукту клієнту	17.12.26	17.12.26	0	0.0

Зайнятість ресурсів

